




Baumaßnahmen, Stand Juli 2009

BUGA Koblenz 2011 GmbH und Stadt Koblenz

Übersicht der voraussichtlichen Ausführungszeiten im Stadtbereich (ohne Ausstellungsbau)

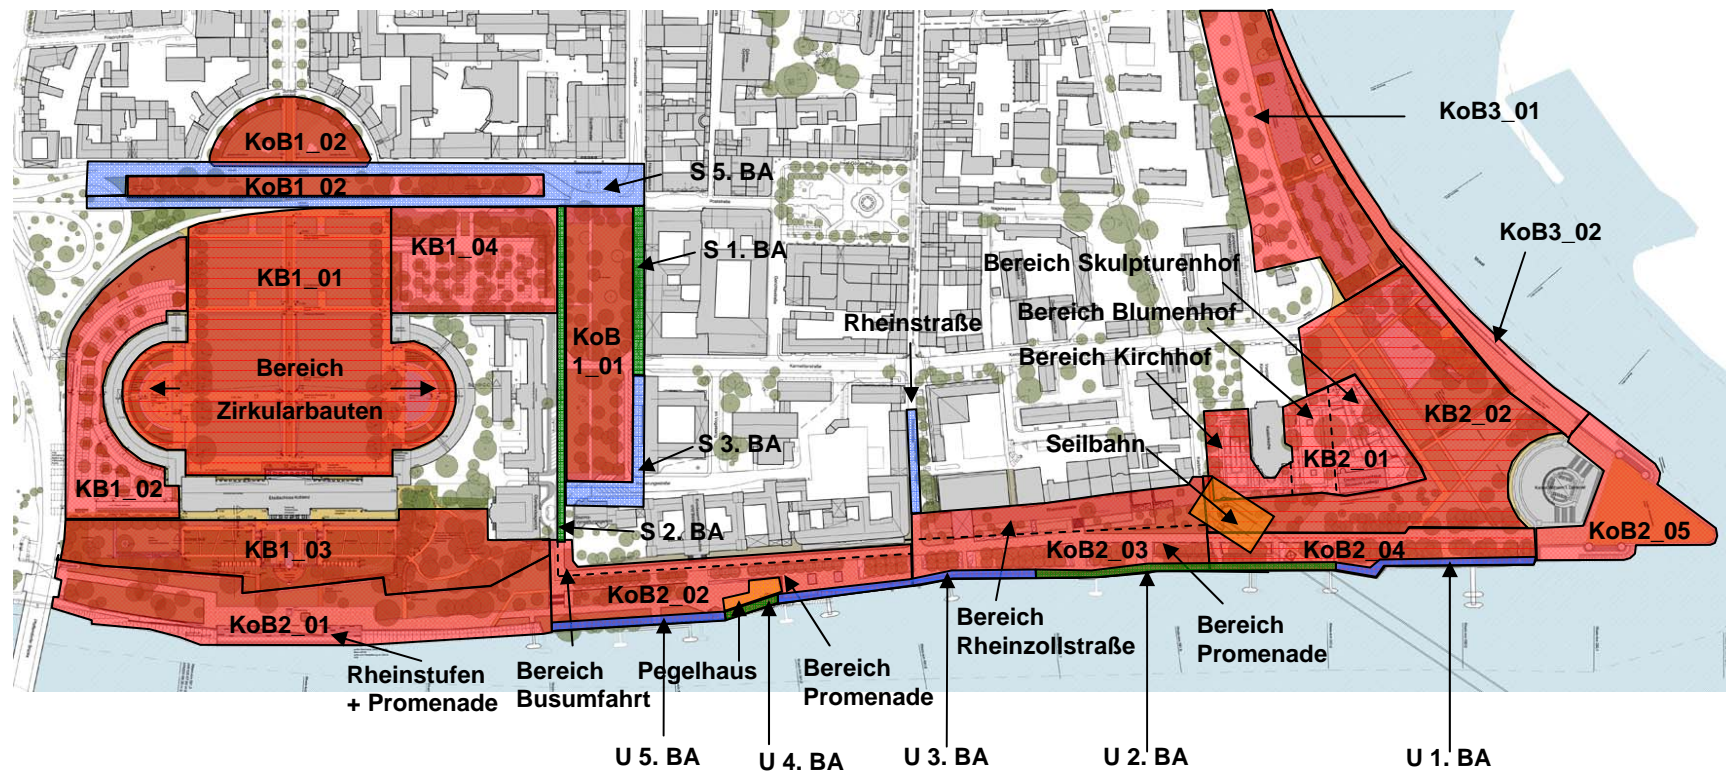



Baumaßnahmen BUGA Koblenz 2011 GmbH

KB1 Schloss

KB1_01: Juni 2009 – September 2009 (Zirkularbauten)
KB1_01: September 2009 – November 2009 (Zirkularbauten: Pflanzungen)
KB1_01: Oktober 2009 – Juni 2010 (Grundausbau nach Fertigstellung Tiefgarage)
KB1_02: Juni 2008 – Juni 2009 (Bau, incl. Beleuchtung und Pflanzungen)
KB1_02C: Juni 2008 – Dezember 2008 (Erdarbeiten)
KB1_02: Januar 2009 – September 2009 (Ausbau)
KB1_02: September 2009 – November 2009 (Pflanzungen)
KB1_04: April 2010 – September 2010

KoB1 Schlossumfeld

K0B1_01: April 2010 – September 2010
K0B1_02: Mai 2010 – Oktober 2010

Seilbahn

G: April 2009 – Juli 2009 (Fundamente)
G: August 2009 – Dezember 2009 (Stahlbau)
G: Februar 2010 – Mai 2010 (Drahtseilarbeiten)

KB2 Blumenhof

KB2_01: Juli 2008 – Juni 2009 (Kirchhof: Freianlagen)
KB2_01: Dezember 2008 – Juni 2009 (Blumenhof: Freianlagen)
KB2_01: Juli 2010 – Oktober 2010 (Skulpturenhof: Freianlagen)
KB2_02: April 2010 – Januar 2011 (Freianlagen)

KoB2 Konrad-Adenauer-Ufer

K0B2_01: März 2009 – Oktober 2009 (Rheinstufen)
K0B2_01: September 2009 – März 2010 (Promenade)
K0B2_01: März 2010 – September 2010 (Pflanzungen)
K0B2_02: Juni 2009 – April 2010 (Bereich Promenade: Wege-/Tiefbau, Freianlagen)
K0B2_02: März 2010 – Juni 2010 (Bereich Promenade: Pflanzungen)
K0B2_02: Juni 2009 – April 2010 (Bereich Busumfahrt: Tiefbau/Ver-/Entsorgung)
K0B2_02: April 2010 – Oktober 2010 (Bereich Busumfahrt: Beläge)
K0B2_03: Oktober 2009 – April 2010 (Bereich Rheinzollstraße: Wege-/Tiefbau, Freianlagen)
K0B2_03: März 2010 – Juni 2010 (Bereich Rheinzollstraße: Pflanzungen)
K0B2_03: April 2010 – Oktober 2010 (Bereich Promenade: Wege-/Tiefbau, Freianlagen)
K0B2_03: Oktober 2010 – Dezember 2010 (Bereich Promenade: Pflanzungen)
K0B2_04: August 2009 – April 2010 (Freianlagen)
K0B2_04: März 2010 – Juni 2010 (Pflanzungen)
K0B2_05: April 2010 – Juli 2010 (Freianlagen)



KoB3 Peter-Altmeier-Ufer

KoB3_01: November 2009 – April 2010

KoB3_02: November 2009 – April 2010

Bauabschnitte Straßen- und Kanalbau

Rheinstraße: ab März 2010

S 1. BA: September 2008 – März/April 2009

S 2. BA: März/April 2009 – Oktober 2009

S 3. BA: Kanalbau Regierungsstraße: ab März 2009

S 3. BA: Straßenbau Regierungsstraße und Reichensperger Platz: November 2010 – Februar 2011

S 5. BA: März 2010 – Dezember 2010

Bauabschnitte Ufermauersanierung

U 1. BA: Oktober 2008 – Juli 2009

U 2. BA: Februar 2010 – Juli 2010

U 3. BA: August 2009 – Januar 2010

U 4. BA: August 2009 – Januar 2010

U 5. BA: Oktober 2008 – Juli 2009

Pegelhaus

Umbau Pegelhaus: März 2009 – September 2009
